


PROJETO
SAMU POA
06/10/23



TAREFAS

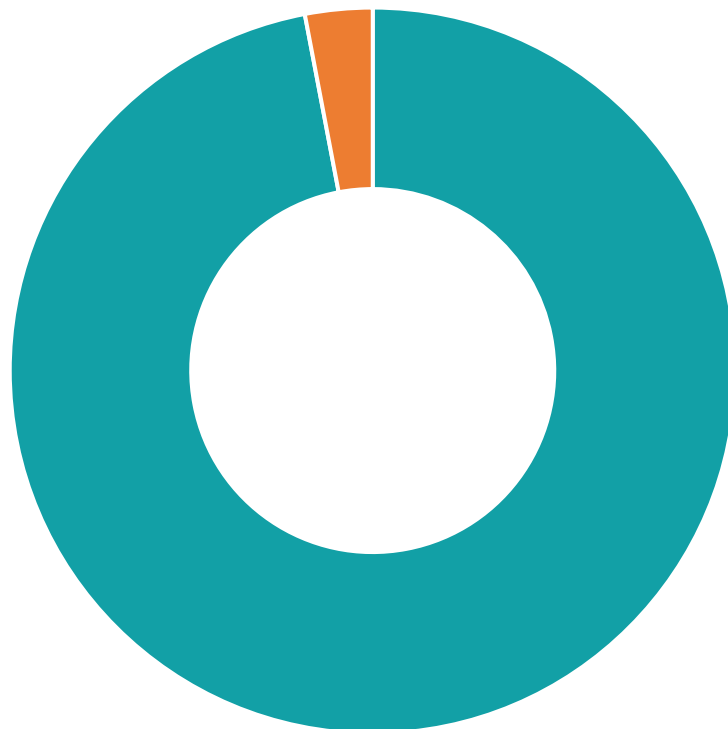

■ 97% concluído
■ 3% em andamento

INÍCIO DO PROJETO: 4/1/2023

TÉRMINO ESTIMADO: 16/10/2023



05

EQUIPES ENVOLVIDAS



82

TAREFAS PLANEJADAS



08

MESES DE TRABALHO



97%

CONCLUÍDO



100

DIAS DE ATRASO


A FAZER

Concluir os testes da Telefonia IP

Agendar a data da virada da Telefonia

Indicação e Instalação Postos de Contingência (SES e PROCEMPA)


Acompanhamento da entrega



EM ANDAMENTO

Testes Telefonia com a PROCEMPA (previsão de término até 13/10)

Instalação acessos ADM ao SAPH (Aguarda PROCEMPA) - **ELIEL informou que a PROCEMPA tem até hoje como prazo para concluir o serviço.**



CONCLUÍDO

Definição dos postos de contingência ADM

Módulo Gestão de Urgências

Ativação de novas funcionalidades da versão

Inserção do Gabarito Saúde Mental no EAD

Aceite na Plataforma EAD



ACESSO AOS POSTOS DE TRABALHO E POSTOS DE CONTINGÊNCIA

PRÓXIMOS PASSOS

Ajustar o escopo do despacho SEI: Indicar os postos de trabalho que terão o acesso ao SAPH dentro do processo.

14/09



PROCEMPA deverá enviar para a True os dados técnicos para a comunicação entre as redes.



True irá realizar as configurações



Realizar os testes e validar a comunicação. (True)

Estamos aguardando a resposta no Processo SEI

TESTES DE TELEFONIA IP

PRÓXIMOS PASSOS

Central foi configurada para testes, apresentando instabilidades na comunicação.



A True irá reconfigurar a comunicação.

15/09



PROCEMPA deverá validar a conectividade

25/09



O período de teste será retomado pela True

02/10



Previsão de uma semana de testes

13/10




Desenvolvimento da RDM pela True




Agendar a data da virada da Telefonia.

- PENDÊNCIAS DE HARDWARE -

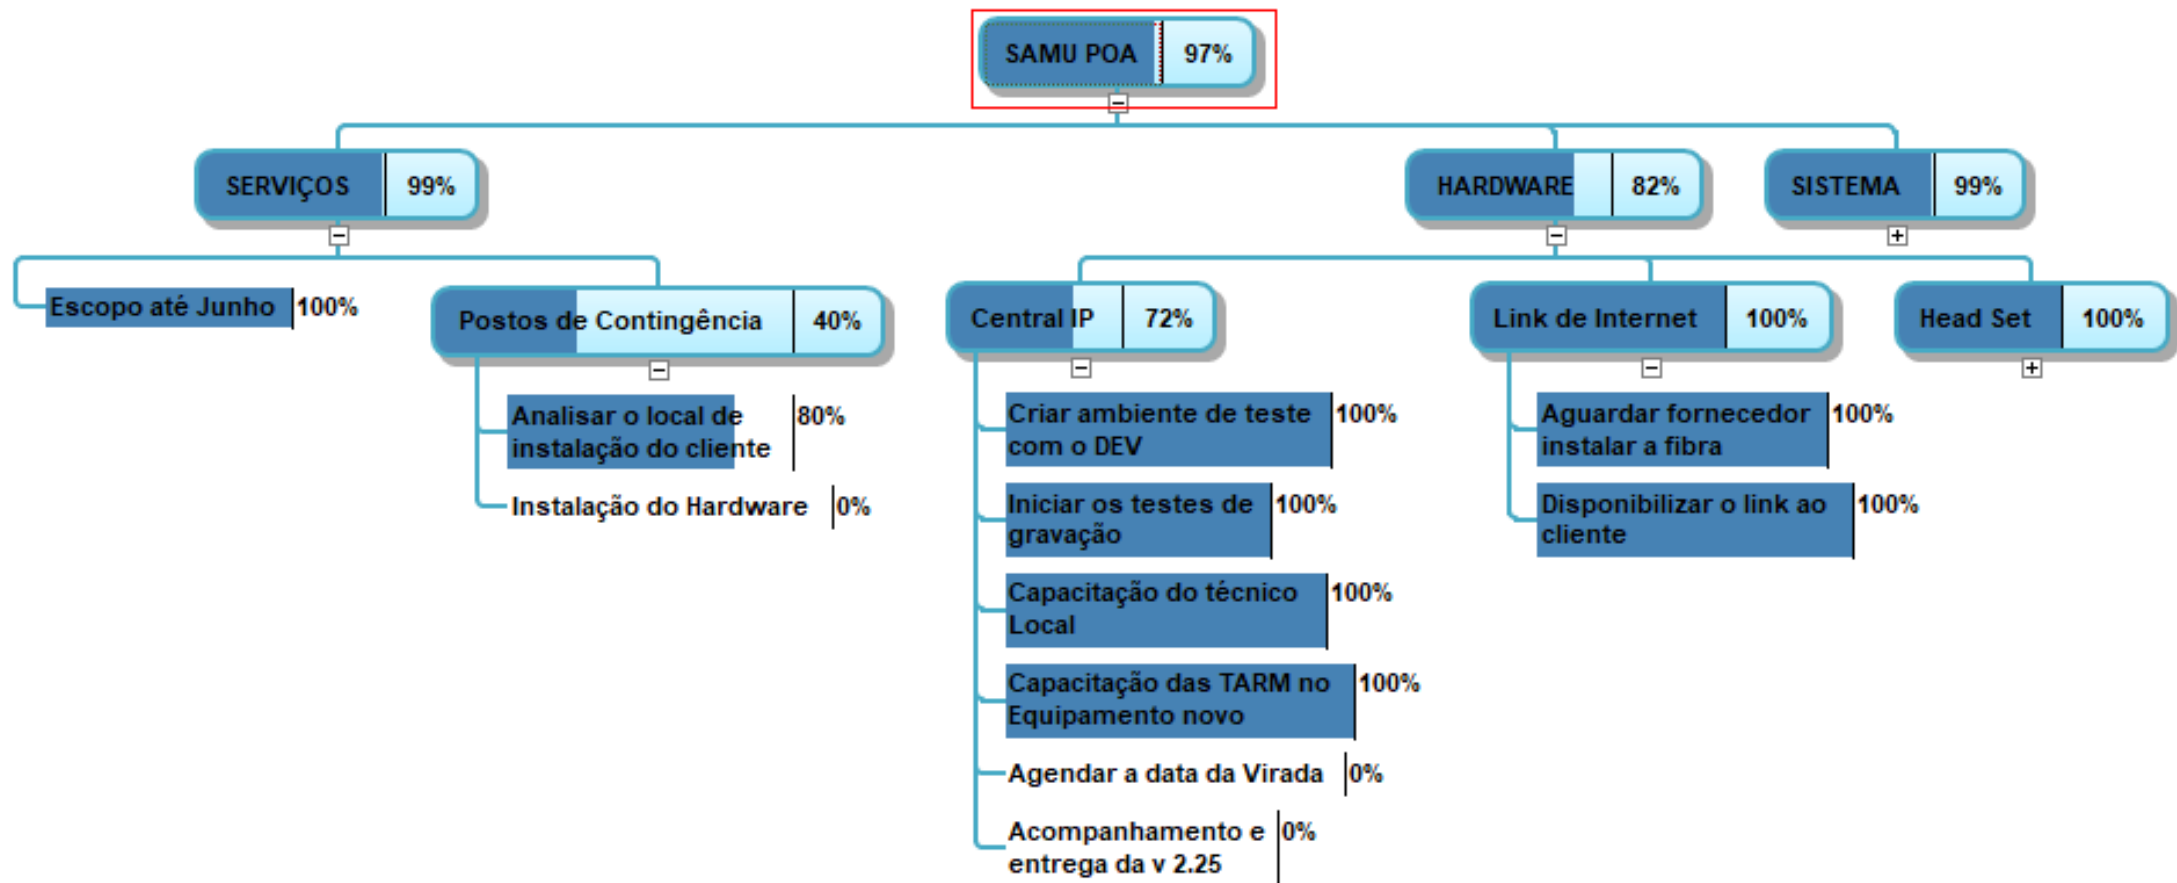

- PENDÊNCIAS DE SISTEMA -

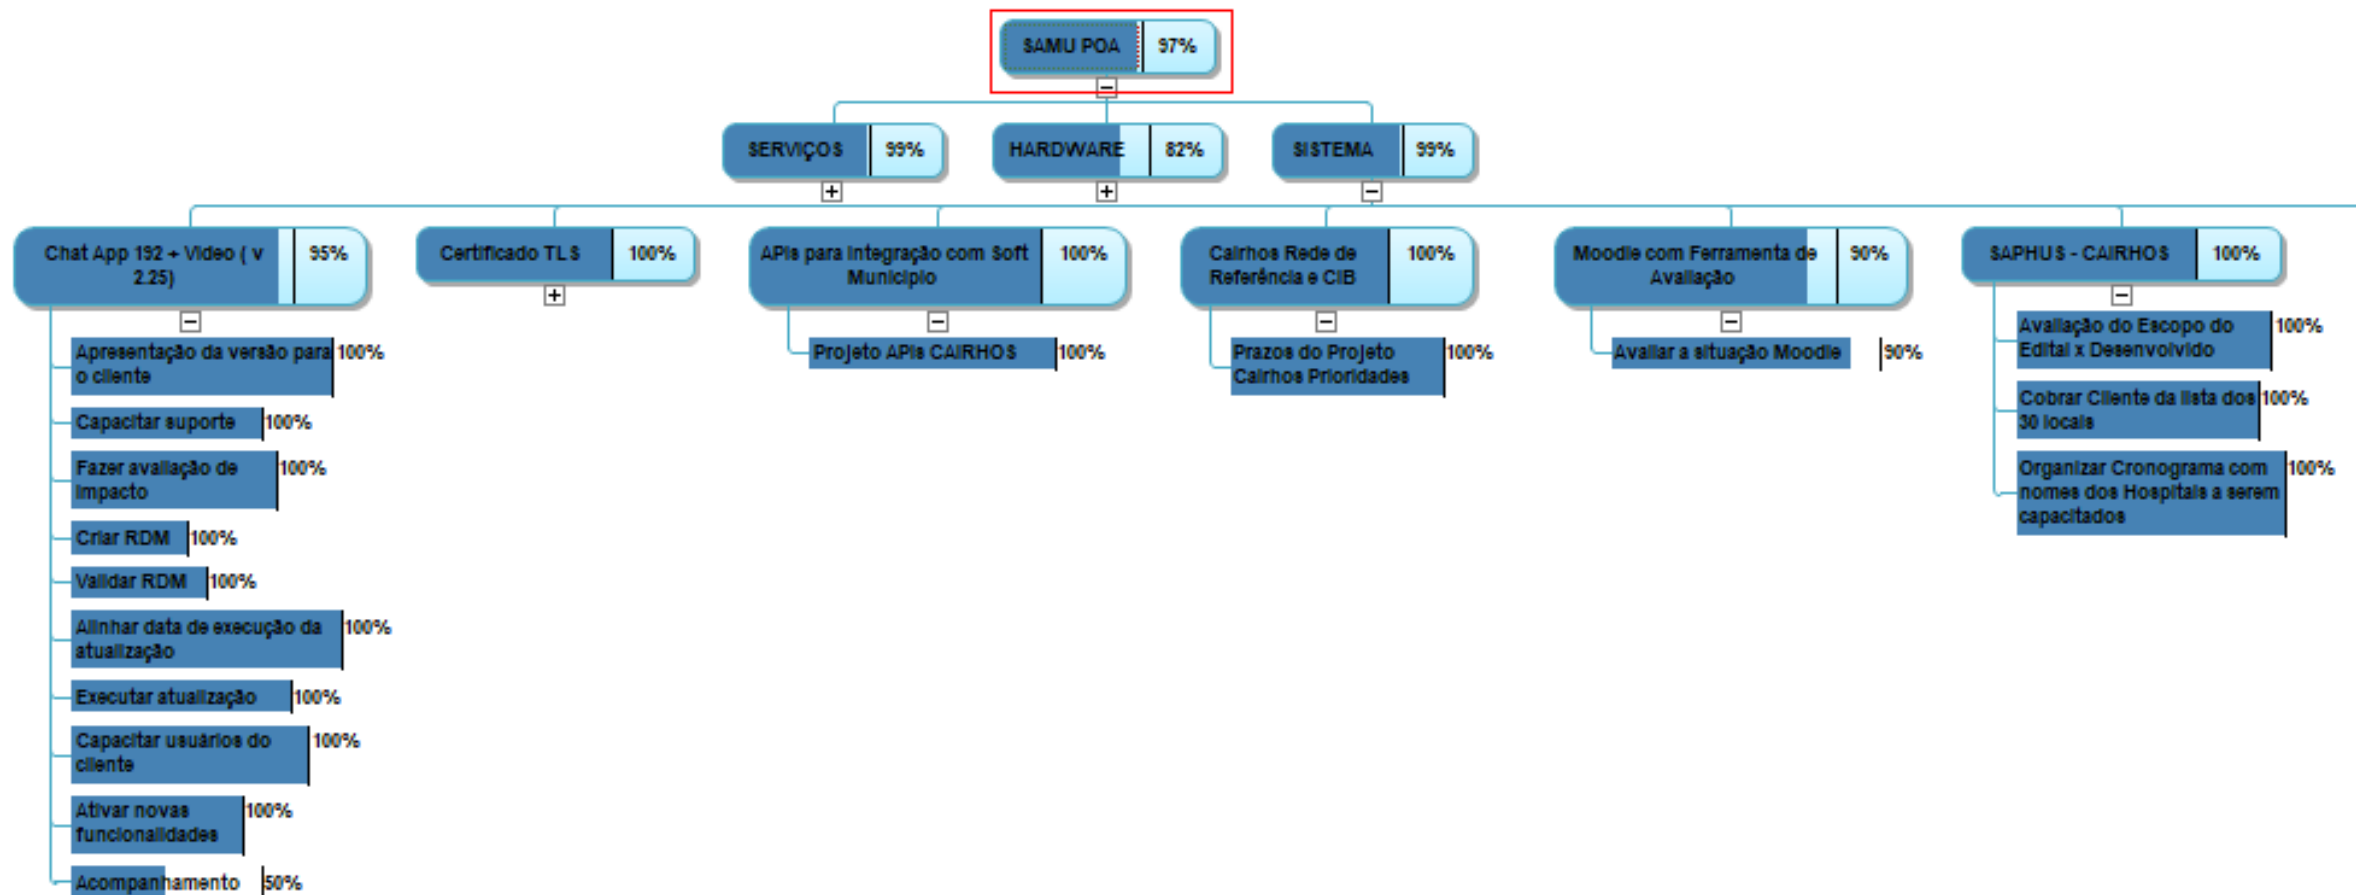

 **TRUE**
